

*BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BIH  
UNSKO SANSKI KANTON  
OPĆINA SANSKI MOST  
JU“Općinski fond za komunalne  
djelatnosti i infrastrukturu“  
Sanski Most*

**IZVJEŠTAJ O RADU  
SA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJEM  
ZA 2015. GODINU**

SADRŽAJ:

I.	OPĆI PODACI O PRAVNOM SUBJEKTU.....	str. 2
II.	UVOD.....	str. 3
III.	PREGLED MATERIJALNIH TROŠKOVA.....	str. 4
IV.	NEIZMIRENE OBAVEZE.....	str. 5
V.	INVESTICIJE.....	str. 6
VI.	ODRŽAVANJE PUTEVA.....	str. 7-15
VII.	JAVNA RASVJETA I ODRŽAVANJE.....	str. 16
VIII.	ZAKLJUČAK.....	str. 17

**OPĆI PODACI O PRAVNOM SUBJEKTU**

**NAZIV -** JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu,,

**ADRESA -** Prijedorska 3  
Sanski Most

**REGISTRACIJA -** Porezna uprava Federacije B i H  
Kantonalni ured UNSKO -SANSKI

**DATUM REGISTRACIJE -** 21.12.2005. god.

**OBLIK ORGANIZACIJE -** Javna ustanova

**DJELATNOST -** Fond obavlja djelatnosti u oblasti:  
- zajedničke komunalne potrošnje;  
- uređenja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja komunalne infrastrukture;  
- javne rasvjete;  
- ustrojavanje evidencije i obračuna komunalne naknade.

**ID BROJ -** 4263448910003

**ŽIRO RAČUN -** 1990440003006807

**UPRAVNI ODBOR -** Predsjednik - Hilmo Grgić,bach.ing.saobr.  
član - Mensur Seferović, dipl.ing.preh.teh.  
član - Edisa Kumalić,dipl.pravnik  
član - Edisa Hodžić,dipl.pravnik  
član - Edin Habibović,ing.građ.

**BROJ RADNIKA -** 9

**DIREKTOR -** Ernad Seferović,ing.građ.

## **UVOD**

Izvještaj o radu Javne ustanove „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, odnosi se na period januar – decembar 2015.godine.

U ovom izvještaju je jasno i detaljno izvršen prikaz svih aktivnosti koje je ova Ustanova poduzimala u toku 2015.godine u skladu s Planom i programom rada za 2015.godinu, sa financijskim pokazateljima izvršenih obaveza.

Izvještaj se odnosi na prikaz utroška sredstava na ime tekućeg poslovanja Ustanove, što uključuje izdatke za materijalne troškove, redovno ljetno održavanje, zimsko održavanje, zajedničku komunalnu potrošnju sa izvještajem za održavanje pasivnih mezarja, grobalja i spomen obilježja, održavanje cvijetnih i parkovskih površina, te izdatke za javnu rasvjetu.

U izvještaju je izvršen i poseban prikaz dugovanja prema izvođačima radova, odnosno dobavljačima na dan 31.12.2015.godine.

Implementacija projekata u 2015.godini sa financijskim pokazateljima je prikazan u tabeli na strani 6 ovog izvještaja.

PREGLED MATERIJALNIH TROŠKOVA I ULAGANJA U 2015.GODINI

R/b	OPIS STAVKE	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
		2015.god.	2015.god.	Ost/pl.2015.g
1.	Neto plaće	118.700,00	117.057,00	98,6
2.	Doprinosi iz plaća	55.400,00	55.007,00	99,3
3.	Doprinosi na plaće	18.600,00	18.631,00	100,1
4.	Porezi na dohodak	5.800,00	5.319,68	91,7
5.	Naknada za prevoz na posao	5.100,00	3.829,20	75,1
6.	Naknada za naknadni rad i UO	6.500,00	7.000,00	107,7
7.	Naknada za topli obrok (+sezonski uposlenici)	24.200,00	33.805,92	139,7
8.	Regres za godišnji odmor	4.200,00	3.739,50	89,0
9.	Putni troškovi i troškovi dnevnica(seminari, edukacije )	1.400,00	708,15	50,6
10.	Ugovor o djelu	2.140,00	2.990,00	139,7
11.	Izdaci za tel/fax, internet i JP-BIH pošta	4.500,00	2.458,80	54,6
12.	Izdaci za gorivo	3.000,00	2.199,00	73,3
13.	Izdaci za kancel. materijal	3.000,00	1.719,34	57,32
14.	Osiguranje radnika	1.000,00	1.260,00	126,0
15.	Izdaci bankarskih usluga	1.000,00	1.299,30	129,9
16.	Usluge javnog informiranja i medija	3.200,00	2.916,64	91,1
17.	Usluge reprezentacije	800,00	344,81	43,1
18.	Registracija i održavanje vozila	2.200,00	1.653,82	75,2
19.	Nabavka i održavanje opreme	800,00	258,90	32,4
20.	Knjigovodstvene usluge	2.840,00	2.840,00	100,0
21.	Usluge tekućeg održavanja prostorija	1.000,00	532,43	53,2
22.	Nabavka materijala za održavanje ulične rasvjete	9.620,00	13.107,98	136,3
23.	Usluge projektovanja i nadzora	-----	1.673,36	-----
	<b>UKUPNO:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>280.351,83</b>	<b>101,9</b>

Povećanje materijalnih izdataka u 2015.god. ostvareno je pod stavkom 7. koja se odnosi na izdatke vezane za isplatu toplog obroka. Planom za 2015.godinu za istu stavku je predviđen iznos od 24.200,00 KM dok je u 2015.godini po toj stavci isplaćeno 33.805,92 KM što predstavlja uvećanje od 139,7 %. Do povećanja je došlo zbog angažiranja dvadeset lica preko FZZZ-a, kroz projekat Javni radovi 2015, koji su bili uposleni u periodu septembar-decembar 2015.godine i za koja lica su vršene uplate za topli obrok.

Znatno povećanje je ostvareno pod stavkom 22. (nabavka materijala za održavanje ulične rasvjete), a do kojeg povećanja je došlo zbog radova na proširenju JR i sanacije, odnosno zamjene oštećenih i dotrajalih uličnih lampi novim lampama i štednim sijalicama.

IZVJEŠTAJ O RADU SA FINACIJSKIM IZVJEŠTAJEM ZA 2015.GODINU

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2015.godine

	<b>DOBAVLJAC</b>	<b>SALDO</b>
1	"TUŠ TRADE" DOO KAMENICA BIHAĆ	-36,93
2	JPNIO SLUŽBENI LIST BIH	-396,70
3	ČAVKUNOVIĆ BP d.o.o. BIHAĆ	-751,86
4	JKP SANA	-342.662,05
5	L-EM SERVIS	-330,24
6	DIVEL d.o.o.	-17.779,86
7	ARGE INZENJERING	-5.940,09
8	CVJECAR KAM	-15.038,49
9	VECERNJI LIST	-482,14
10	STEP SARAJEVO SEMAFOR	-614,25
11	KOV GRAD d.o.o.	-11.445,61
12	ELMONT	-2.498,15
13	GANIC d.o.o.	-162.464,54
14	ELEKTRO SANSKI MOST	-54.857,09
15	GRAPING d.o.o.	-2.522,85
16	JKP VODOVOD SANSKI MOST	-4.329,00
17	KOMUNALNA NAKNADA	-234,00
18	MUJEZINOVIC DOO	-0,87
19	AGI CONSULTING ARGE INZENJERING	-8.586,27
20	BH TELECOM	-351,88
21	ELEKTROMONTAZA KLJUC	-29.574,78
22	JP BH POSTA DOO	-40,49
23	KUKAVICA COMERC	-1.701,58
24	NO LIMIT TECHNOLOGY DOO	-1.068,69
25	PRIVREDNA STAMPA ZIPPS	-1.099,01
26	ZAVOD ZA SAOBRAČAJ SARAJEVO	-1.437,56
27	ZR LOGO ART	-344,50
28	MARICIUS-BH DOO	-20,00
29	OPCA VODNA NAKNADA	-39,13
30	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH	-754,40
31	MEGASPAR DOO	-544,80
32	ZAMM MEDIA CONSULTING DOO	-2.338,86
33	NOTAR, TROŽIĆ ŠEFIK	-474,50
34	BLICNET DOO	-30,96
35	MARICIUS – BH DOO	-173,00
36	SEJA DOO	-144,81
37	PRIMAPROM DOO	-468,06
38	ELIM DOO	-9.107,98
39	SARAJEVO OSIGURANJE	-90,00
40	RAZA- L DOO	-1.000,00
41	IG BANJA LUKA	-391,61
42	SAVICO DOO	-29.873,75
43	ŠF INŽENJERING	-61.597,90
44	ELEKTROTIM DOO	-11.729,60
45	KANTONALNI SUD U BIHAĆU	-842,20

Ukupne obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2015.godine iznose 786.130,06 KM.

**IMPLEMENTACIJA PROJEKATA NA OPĆINI SANSKI MOST U 2015. GODINI**

R/	NAZIV PROJEKTA	Vrijednost	OPĆINA	SREDSTVA DONATORA		VRIJEDNOST
		po	FOND	iznos KM	iznos KM	Naziv donatora
b.		UGOVORU	iznos KM	iznos KM	Naziv donatora	
1.	MZ Grad Lijeva obala – Ul. Prijedorska (izgradnja trotoara i kružnog toka)	93.553,29	50.683,00			<b>93.284,06</b>
3.	MZ Grad Desna obala- izgradnja javne rasvjete u naselju Kruhari	19.976,00	10.000,00	9.976,00	<b>Gradani</b>	<b>19.976,00</b>
4.	Izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju ulice u MZ Grad, Lijeva obala -Alagića naselje (pored lokala ACONDA)	24.229,752 <b>,75</b>	12.114,88,88	12.114,87	<b>Gradani</b>	<b>24.229,75</b>
5.	MZ Kijevo – asfaltiranje nekateg. puta u naselju Drozgača	74.689,68	14.689,74	15.000,00 45.000,00	<b>Gradani</b> <b>Feder.minis.za raseljena lica</b>	<b>74.689,68</b>
6.	Izvođenje radova na presvlačenju asfaltnog zastora ulice u Kruharima	17.586,00	-----	17.586,00	<b>Sredstva GSM licence</b>	<b>17.586,00</b>
7.	Izvođenje radova na presvlačenju asfaltnog zastora ulice Redak	86.130,00	-----	86.130,00	<b>Sredstva GSM licence</b>	<b>86.130,00</b>
8.	Izvođenje radova na presvlačenju asfaltnog zastora u MZ Trnova	31.280,50	-----	31.280,50	<b>Sredstva GSM licence</b>	<b>31.280,50</b>
9.	Izgradnja mosta u MZ Stari Majdan na rijeci Kutanji	31.890,00	-----	31.890,00	<b>Sredstva kanton.CZ</b>	<b>31.890,00</b>
10.	Izvođenje radova na asfaltiranju nekateg.puta u MZ Pobjriježje(trasa bivše pruge)	22.269,40	20.000,00	2.269,40	<b>Gradani</b>	<b>22.269,40</b>
11.	MZ Zdena- izgradnja javne rasvjete u naselju Krkojevci	14.499,00	10.000,00	4.999,00	<b>Gradani</b>	<b>14.999,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>519.299,50</b>	<b>141.706,86</b>	<b>316.245,77</b>		<b>500.553,63</b>

Prema prijedlogu investicija za 2015.godinu ukupna vrijednost planiranih investicija je iznosila 1.422.318,07 KM. U toku 2015.godine realizovan je veći dio projekata prema Programu rada za 2015.godinu i dio projekata za koji su potpisani ugovori iz 2014.godine, tako da ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 500.553,63 KM. Od navedenog iznosa obaveze Ustanove na ime izvedenih radova su iznosile 141.706,86 KM, dok je iznos od 316.245,77 KM osiguran sredstvima sa drugih nivoa vlasti i sredstvima građana.Na ovaj način je za izvedene radove u toku 2015.godine izvođačima radova isplaćen iznos od 457.952,63 KM, čime su skoro u cijelosti izmirene obaveze za investicije prikazane u gornjoj tabeli.


**PREGLED IZVRŠENIH RADOVA  
TEKUĆEG ODRŽAVANJA**

- REDOVNO LJETNO ODRŽAVANJE,
- ZAJEDNIČKA KOMUNALNA POTROŠNJA,
- ODRŽAVANJE CVJETNIH POVRŠINA,
- REDOVNO ZIMSKO ODRŽAVANJE,
- ODRŽAVANJE PASIVNIH MEZARJA, GROBALJA I SPOMEN  
OBILJEŽJA,
- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE.




## GRAFIČKI PRIKAZ TEKUĆEG ODRŽAVANJA

### PLANIRANI RADOVI

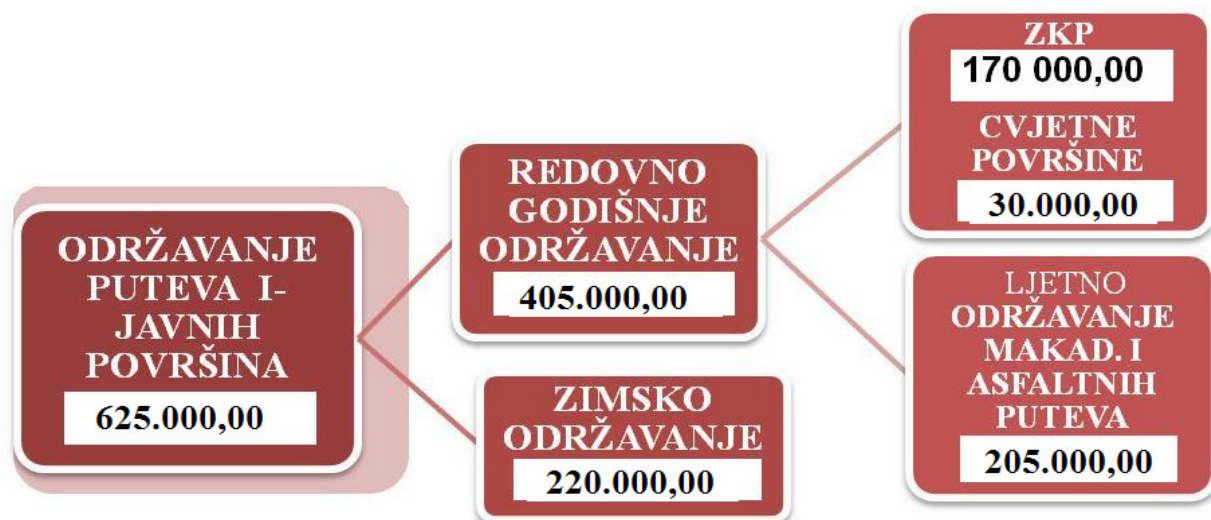

### OSTVARENI RADOVI

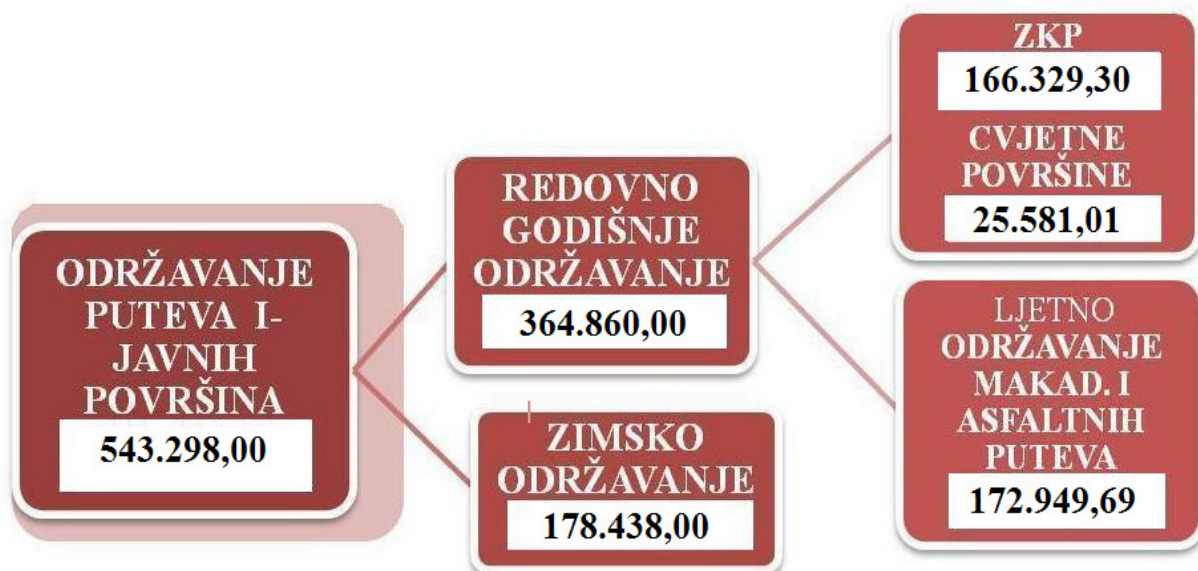

**REDOVNO LJETNO ODRŽAVANJE PUTEVA**

	<b>NAZIV STAVKE</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>OSTVARENO</b>
1.	KAMENI MATERIJAL ZA NASIPANJE GRADSKIH MAKADAMSKIH PUTEVA	21.800,00	26.334,50
2.	KAMENI MATERIJAL ZA NASIPANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH MAKADAMSKIH PUTEVA	50.000,00	47.891,00
3.	SANACIJA UDARNIH RUPA NA GRADSKIM ASFALTNIM PUTEVIMA	55.000,00	36.385,70
4.	SANACIJA UDARNIH RUPA NA LOKALNIM I NEKATEGORISANIM ASFALTNIM PUTEVIMA	20.800,00	22.808,48
5.	IZRADA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE U GRADSKOM PODRUČJU	25.000,00	29.873,75
6.	IZRADA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE U VANGRADSKOM PODRUČJU	3.600,00	906,40
7.	IZRADA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE U GRADSKOM PODRUČJU	25.400,00	8749,86
8.	IZRADA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE U VANGRADSKOM PODRUČJU	3.400,00	0,00

Planom i programom za 2015. godinu za ljetno održavanje puteva bilo je predviđeno 205.000,00 KM (ljetno održavanje makadamskih i asfaltnih puteva). Od planirane vrijednosti realizovani su poslovi u iznosu 172.949,69 KM.

Iz naprijed navedenog u pogledu priliva i utroška sredstava na redovnom ljetnom održavanju puteva može se zaključiti da su poslovi na pomenutom održavanju izvođeni u skladu sa Planom za 2015.godinu, a što predstavlja olakšanje za još kvalitetnije usluge na ovom polju u 2016.godini.

*Redovno ljetno održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva podijeljeno je u pet zona.*

**ZONA I obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ LIJEVA OBALA
- MZ DESNA OBALA
- MZ ŠHOVCI
- MZ TRNOVA

Od planirane vrijednosti realizovani su poslovi u iznosu 78.496,21 KM.

Radove na realizaciji poslova izvodili su:

DOO „DIVEL“ Sanski Most, JKP „SANA“ DOO Sanski Most u stečaju i DOO „SAVICO“ Sarajevo.

Radove na redovnom ljetnom održavanju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva izvodili su DOO „DIVEL“ Sanski Most i JKP „SANA“ DOO Sanski Most u stečaju, dok je DOO „SAVICO“ Sarajevo izvodilo radove na postavljanju horizontalne signalizacije.

**ZONA II obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ ZDENA
- MZ POBRIJEŽJE
- MZ STARI MAJDAN
- MZ HUSIMOVCI
- MZ DEMIŠEVCI

Od planirane vrijednosti realizovani su poslovi u iznosu 22.476,04 KM.

**ZONA III obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ VRHPOLJE
- MZ HRUSTOVO
- MZ TOMINA
- MZ KIJEVO
- MZ ČAPLJE

Od planirane vrijednosti realizovani su poslovi u iznosu 22.411,04 KM.

**ZONA IV obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ DONJI KAMENGRAD
- MZ GORNJI KAMENGRAD
- područje DABRA

Od planirane vrijednosti realizovani su poslovi u iznosu 27.166,40 KM.

**ZONA V obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:**

- MZ LUŠCI PALANKA
- MZ SKUCANI VAKUF
- MZ FAJTOVCI
- MZ PODRUČJE MILANOVCA

Od planirane vrijednosti realizovani su poslovi u iznosu 22.400,00 KM.

**Radove na realizaciji poslova u ZONI II,III, IV I V izvodilo je preduzeće:  
DOO „DIVEL“ Sanski Most.**

**Radovi na redovnom ljetnom održavanju gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva obuhvataju slijedeće:**

- Čišćenje i uređenje sistema za odvodnju,
- Košenje trave i uklanjanje granja,
- Zamjena vertikalne signalizacije,
- Izrada horizontalne signalizacije,
- Obnova i izrada oznaka na kolovozu,
- Popravka antikorozivne zaštite zaštitnih i drugih ograda,
- Uređenje sistema za odvodnju,
- Uređenje bankina,
- Mjestimični popravci betonskih ivičnjaka,
- Popravci lokalnih oštećenja kolovoza (nasipanje makadamskih puteva),
- Uređenje javnih površina,
- Ostali poslovi.

**ZAJEDNIČKA KOMUNALNA POTROŠNJA**

	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	KOŠENJE JAVNIH POVRŠINA	40.000,00	37.823,45
2.	ČIŠĆENJE SISTEMA ZA ODVODNJU	10.000,00	8.595,00
3.	ČIŠĆENJE GRADSKIH ULICA (MAŠINSKI/RUČNO)	95.000,00	92.355,94
4.	DEKORACIJA	10.000,00	12.729,60
5.	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE PASIVNIH MEZARJA I GROBALJA	15.000,00	14.825,33

Planom i programom za 2015. godinu za zajedničku komunalnu potrošnju bilo je predviđeno 170.000,00 KM, od navedene planirane vrijednosti realizovano je 166.329,30 KM.

**Radovi koji se izvode u okviru ZKP – e obuhvataju slijedeće:**

- Čišćenje asfaltnih kolovoza i trotoara,
- Pranje gradskih ulica sa čišćenjem i održavanjem slivnih rešetki,
- Polijevanje gradskih makadamskih ulica u ljetnom periodu (prašina),
- Košenje i uređenje parkovskih i zelenih površina sa odvozom na deponiju,
- Održavanje cvijetnih površina sa zalijevanjem i prehranom u ljetnom periodu,
- Oblikovanje stabala u parkovima i drvodredima (gradska zona),
- Uklanjanje granja i lišća u jesenjem periodu.

U okviru poslova na održavanju ZKP-e realizovani su radovi na održavanju i čišćenju pasivnih mezarja, grobalja i spomen obilježja. Radove je izvodilo JKP „SANA“DOO Sanski Most – u stečaju, a radovi obuhvataju slijedeće:

- Održavanje prilaznih puteva,
- Održavanje i uređenje staza,
- Sanacija propalih kabura – raka,
- Košenje trave, čišćenje i odvoz smeća,
- Oblikovanje stabala drveća i zasada novih,
- Nabavka i postavljanje korpi za otpatke,
- Nabavka, ugradnja i održavanje postojećih klupa za sjedenje i
- Ostali poslovi.

**CVJETNE POVRŠINE**

	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	ODRŽAVANJE TRAJNICA	4.500,00	4.489,51
2.	PREHRANA SVIH BILJAKA	1.500,00	1.170,00
3.	ODRŽAVANJE TRAVNATIH POVRŠINA	4.500,00	4.300,00
4.	ZAMJENA OŠTEĆENOG I DOTRAJALOG BILJA	2.500,00	1.750,00
5.	PROLJETNA SADNJA	8.000,00	6.901,40
6.	SADNJA LJETO – JESEN	6.000,00	4.800,40
7.	SADNJA TRAJNICA	3.000,00	2.169,70

Planom i programom za 2015. godinu za cvjetne površine bilo je predviđeno 30.000,00 KM, od navedene planirane vrijednosti realizovano je 25.581,01 KM.

Dobro planiranje i dovoljan iznos obezbjeđenih sredstava za poslove održavanja cvjetnih i parkovskih površina su pokazatelji zadovoljavajućeg stanja na pomenutim površinama.

Radove na poslovima održavanja cvjetnih i parkovskih površina je izvodio CVJEČAR-Kamengrad iz Sanskog Mosta.

**ZIMSKO ODRŽAVANJE**

	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	RAD MAŠINA NA ODRŽAVANJU PUTEVA (I RUČNO ČIŠĆENJE SNIJEGA)	155.000,00	134.103,00
2.	KAMENA SITNJEŽ 4-8mm	17.000,00	8.116,00
3.	SANACIJA UDARNIH RUPA HLADNOM MASOM	5.200,00	-----
4.	GABARITNE MOTKE	8.800,00	7.459,00
5.	ROVNI MATERIJAL ZA SANACIJU MAKADAMA	24.000,00	20.800,00
6.	INDUSTRIJSKA SO ZA POSIPANJE ASFALTNIH PUTEVA	10.000,00	7.960,00

Planom i programom za 2015. godinu za zimsku službu bilo je predviđeno 220.000,00 KM, a za istu je utrošeno 178.438,00 KM.

***Zimsko održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva podijeljeno je u pet zona.***

Zimsko održavanje i utrošak u zoni I, koja obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:

- MZ LIJEVA OBALA
- MZ DESNA OBALA
- MZ ŠEHOVCI
- MZ TRNOVA

Od planirane vrijednosti u zoni I realizovani su poslovi u iznosu 47.332,00 KM.

Radove je izvodilo JKP „SANA“DOO Sanski Most – u stečaju.

Zimsko održavanje i utrošak u zoni II, koja obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:

- MZ ZDENA
- MZ POBRIJEŽJE
- MZ STARI MAJDAN
- MZ HUSIMOVCI
- MZ DEMIŠEVCI

Od planirane vrijednosti u zoni II realizovani su poslovi u iznosu 22.224,00 KM.

Zimsko održavanje i utrošak u zoni III, koja obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:

- MZ VRHPOLJE
- MZ HRUSTOVO
- MZ TOMINA
- MZ KIJEVO
- MZ ČAPLJE

Od planirane vrijednosti u zoni III realizovani su poslovi u iznosu 27.985,00 KM.

Zimsko održavanje i utrošak u zoni IV, koja obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:

- MZ DONJI KAMENGRAD
- MZ GORNJI KAMENGRAD
- MZ PODRUČJE DABRA

Od planirane vrijednosti u zoni IV realizovani su poslovi u iznosu 33.979,50 KM.

Zimsko održavanje i utrošak u zoni V, koja obuhvata slijedeće Mjesne zajednice:

- MZ LUŠCI PALANKA
- MZ SKUCANI VAKUF
- MZ FAJTOVCI

Od planirane vrijednosti u zoni V realizovani su poslovi u iznosu 46.917,50 KM.

**Radove u zoni II, III, IV i V je izvodilo DOO „GANIĆ“ Sanski Most.**

**Radovi na zimskom održavanju obuhvataju slijedeće:**

- Ručno čišćenje snijega,
- Postavljanje zimske signalizacije,
- Postavljanje rubnih motki,
- Pluženje snijega i snježne bljuzgavice,
- Posipanje kolovoza,
- Održavanje kolovoza,
- Čišćenje jaraka,
- Čišćenje šahtova za odvodnju,
- Uklanjanje grana i šiblja za otvaranje preglednosti,
- Rješavanje odvodnje gdje se voda izliva na kolovoz,
- Čišćenje pješćakih staza na mostovima,
- Čišćenje opreme na cesti,
- Čišćenje javnih površina,
- Ostali poslovi.



## JAVNA RASVJETA

Realizacija plana i programa rada Ustanove u dijelu javne rasvjete se odnosi na potrošnju JR za period 01.01.2015.-31.12.2015.godine koja je data u tabelarnom prikazu, nabavke materijala za održavanje javne rasvjete u iznosu od 13.107,98 KM i troškova na ime izvođenja radova na odražavanju javne rasvjete. Radove na održavanju JR za 2015.godinu je izvodila firma „ELEKTROMONTAŽA“ D.O.O.Ključ, a vrijednost izvedenih radova je 29.596,00 KM što je za 10.404,00 KM manje u odnosu na planirano (40.000,00KM).

### JAVNA RASVJETA –POTROŠNJA ZA PERIOD 01.01.2015-31.12.2015.

R/B	MJESNA ZAJEDNICA	UTROŠENO 2014	UTROŠENO 2015
1.	GRAD LIJEVA OBALA	62.913,61	61.421,13
2.	GRAD DESNA OBALA	35.978,86	35.178,00
3.	ZDENA	6.825,59	5.950,30
4.	POBRIJEŽJE	9.668,93	8.760,45
5.	ČAPLJE	9.493,37	8.940,60
6.	FAJTOVCI	21.288,08	20.943,70
7.	SKUCANI VAKUF	5.135,48	5.656,00
8.	DONJI KAMENGRAD	16.735,93	15.494,00
9.	GORNJI KAMENGRAD	13.226,99	13.560,90
10.	HUSIMOVCI	5.015,69	4.958,45
11.	DEMIŠEVCI	3.084,79	2.533,78
12.	TRNOVA	5.096,02	4.840,20
13.	ŠEHOVCI	8.262,35	7.638,70
14.	KIJEVO	6.734,63	6.107,30
15.	TOMINA	4.703,83	4.660,90
16.	HRUSTOVO	11.370,88	11.100,40
17.	VRHPOLJE	15.004,66	14.806,90
18.	STARI MAJDAN	8.230,19	8.100,60
19.	LUŠCI PALANKA	4.317,12	4.211,66
	<b>UKUPNO</b>	<b>253.087,00</b>	<b>244.864,17</b>

#### Radovi koji su izvršeni - Ugradnja i zamjena:

- ✓ Električnih grla za sijalice, sijalica i prigušnica,
- ✓ osigurača, luksomata, fotosondi i sklopki (uklopnika),
- ✓ polomljenih dotrajalih stubova,
- ✓ lampi, metalnih stubova i razvodnih ormara,
- ✓ kablova nadzemnih i podzemnih,
- ✓ PVC fleksibilnih crijeva,
- ✓ spojnih i zateznih armatura (vijci, kuke, zatezne šnale, obujmice, izolacine krpe, nosači kabla idr.) i
- ✓ limitatora (za kontrolu i ograničenje paljenja).

Ustanova je u toku 2015.godine knjižila rashode za javnu rasvjetu u iznosu od 244.864,17 KM.U odnosu na prethodni poslovni period izdaci za javnu rasvjetu niži su za iznos od 8.223,03 KM, a u odnosu na plan ovi izdaci su niži u iznosu od 55.136,00 KM.

Uštede se ogledaju u zamjeni sijalica 250/125 W novim špar sijalicama snage 45 W i permanentnom praćenju vremenske regulacije puštanja u rad i isključivanja javne rasvjete.

## ZAKLJUČAK

Financijsko poslovanje Ustanove se, uz manja odstupanja, odvijalo prema Planu i programu rada za 2015.godinu. Ustanova je u 2015.godini ostvarila prihode u iznosu od 1.499.611,00 KM , a isti se sastoje od prihoda koji su Ustanovi doznačeni od strane Općine Sanski Most u iznosu od 1.472.059,00 KM i neporeznih prihoda u iznosu od 27.552,00 KM ( uplate za tendersku dokumentaciju, uplate od strane FZZZ-a za uposlenike kroz projekat JAVNI RADOVI 2015.godine).

Općina Sanski Most je u toku 2015.godine Ustanovi doznačila ukupan iznos od 1.472.059,00 KM. Ovaj iznos se sastoji od prihoda na ime finansiranja tekućih izdataka i prihoda koji su namjenjeni za finansiranje kapitalnih investicija.

U 2015.godine tekući rashodi Ustanove iznose 1.068.514, 00 KM od čega 280.351,83 KM iznose materijalni troškovi, 543.298,00 KM izdaci za tekuće održavanje i 244.864,17 KM izdaci za javnu rasvjetu.

Razlika od 431.097,00 KM ukazuje na činjenicu da je JU„Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ ostvarila pozitivno poslovanje, a višak sredstava je iskorišten za izmirenje starih obaveza ( po sudskim presudama i zaključenim sudskim nagodbama) prema izvođačima radova.

Ova Ustanova je u toku 2015.godine ostvarila značajan uspjeh kada je u pitanju komunalna naknada.Ukupni prihodi po ovom osnovu ostvareni su u iznosu od 257.801,00 KM što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 54,08 %.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji F BiH Ustanova je angažovala neovisnu revizorsku kuću „REVIZIJA REVITA“ d.o.o. Cazin koja je obavila reviziju finansijskih izvještaja JU“Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ Sanski Most za 2015.godinu i u istoj je utvrđeno da finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno finansijski položaj Ustanove na dan 31.12.2015.godine, odnosno dato je pozitivno mišljenje na finansijsko poslovanje u Ustanovi za 2015.godinu;

Sastavni dio ovog izvještaja je Izvještaj, odnosno mišljenje nezavisnog revizora sa računom prihoda i rashoda za 2015.godinu.

**Direktor**

Ernad Seferović građ.ing.
